

08:00 Uhr – 11:00 Uhr: Feuerwehrgerätehaus Eschweiler über Feld

Bauteilöffnungen:

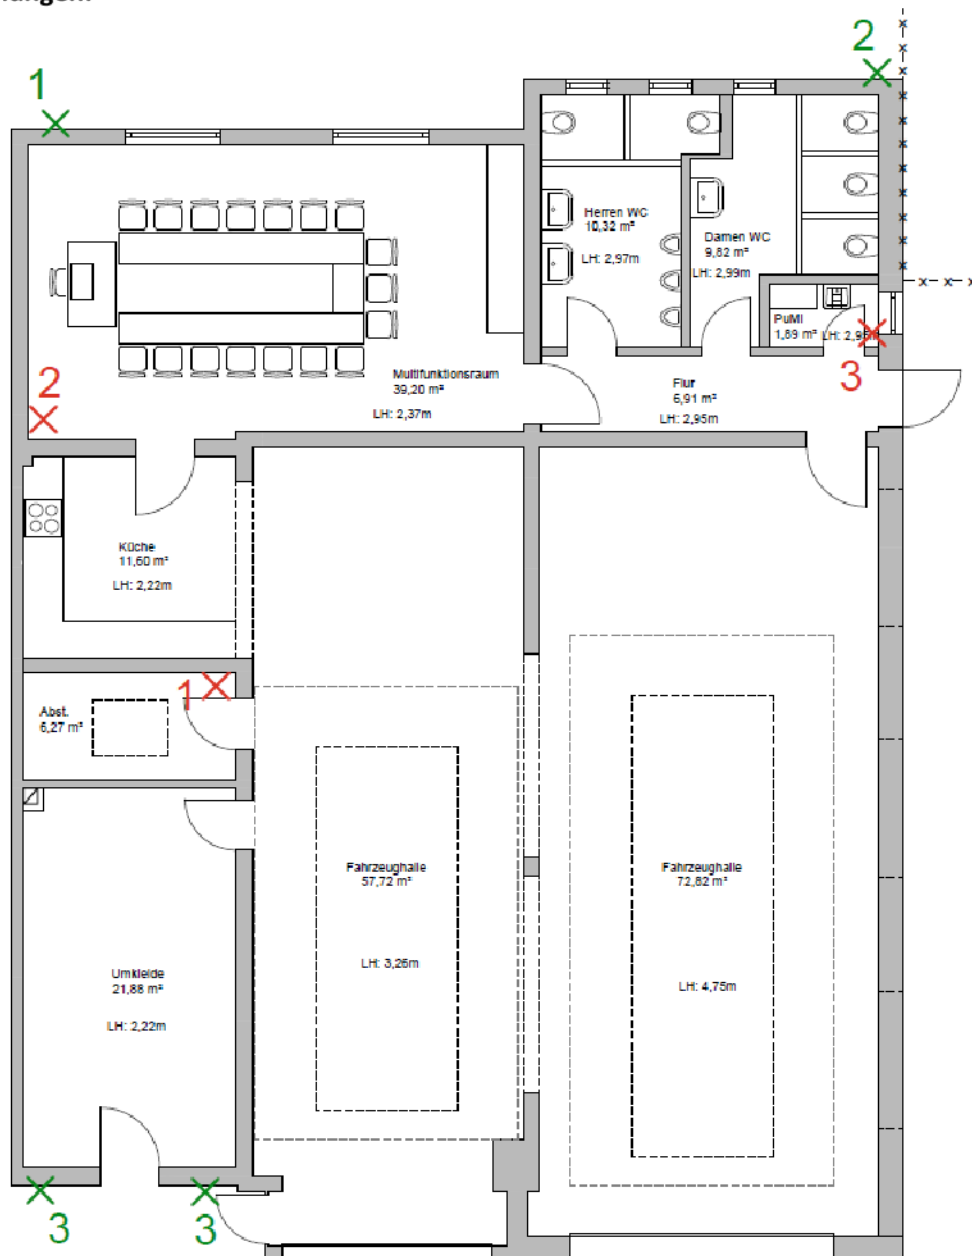


Bild 1: Stellen der Bauteilöffnungen

- Es wurden 7 Bauteilöffnungen durchgeführt: 4x Öffnung Wandaufbau (grün), 3 x Öffnung Fußbodenaufbau (rot)

Bauteilöffnung 1 Wand:

- 24cm Mauerwerk/Klinker, 2cm Dämmung (Polystyrol) innen, Gipskarton



Bild 2: Bauteilöffnung 1 Wand



Bild 3: Bauteilöffnung 1 Wand Innen

Bauteilöffnung 2 Wand:

- 11,5cm Klinker, 6cm Dämmung (mineralisch), 11,5 Mauerwerk (Bims), Putz/Fliesen



Bild 4: Bauteilöffnung 2 Wand

Bauteilöffnung 3 Wand:

- 24cm Mauerwerk/Klinker, Putz



Bild 5: Bauteilöffnung 3 Wand

Bauteilöffnung 1 Boden:

- 2cm Dämmung (mineralisch), ca. 4cm Estrich, (Bodenbelag Vinyl)



Bild 6: Bauteilöffnung 1 Boden

Bauteilöffnung 2 Boden:

- 2cm Dämmung (Polystyrol), ca. 4cm Estrich, (Bodenbelag Fliesen)



Bild 7: Bauteilöffnung 2 Boden

Bauteilöffnung 3 Boden:

- 2cm Dämmung (mineralisch), 4cm Estrich, (Bodenbelag 4mm)



Bild 8: Bauteilöffnung 3 Boden
