Nr.	Vorg/Vorgangsname	Verantwortlichkeiten	Anfang	Ende	Dauer
0	**Rahmenterminplan: Biologische Verwertungsanlage AWZ Mechernich**		**Don 09.02.23**	**Mon 05.08.30**	**1859 Tage**
237	**6 Bauausführung**		**Mit 18.11.26**	**Mon 05.08.30**	**913 Tage**
238	**6.1 Ausschreibung 01: Tiefbau 1**		**Mit 18.11.26**	**Die 05.09.28**	**445 Tage**
239	**6.1.1 Bauausführung Bauabschnitt 1**		**Mit 18.11.26**	**Don 01.06.28**	**379 Tage**
244	**6.1.1.2 Baufeld 1**		**Mit 18.11.26**	**Fre 07.04.28**	**344 Tage**
270	**6.1.1.2.5 Bodenplatte und Fundament Teilüberdachtes Lager**		**Mit 03.03.27**	**Fre 18.06.27**	**72 Tage**
271	6.1.1.2.5.1 Übergabe Geprüfte Statik an AN Tiefbau	AN Teilüberdachtes Lager	Mit 03.03.27	**Mit 03.03.27**	0 Tage
272	6.1.1.2.5.2 Geprüfte Statik	AN Tiefbau 1	Don 04.03.27	Fre 30.04.27	40 Tage
273	6.1.1.2.5.3 Profilierung/ Fundamentaushub	AN Tiefbau 1	Mit 05.05.27	Mit 12.05.27	5 Tage
274	6.1.1.2.5.4 Stützwand, Frostschürze und Bodenplatte	**AN Tiefbau 1**	**Fre 21.05.27**	**Fre 18.06.27**	20 Tage
275	6.1.1.2.5.5 Dachentwässerung, ACU-Rinne, Anschlussleitungen	AN Tiefbau 1	Mit 05.05.27	Don 20.05.27	10 Tage
311	**6.1.1.3 Baufeld 2**		**Mit 18.11.26**	**Fre 09.07.27**	**156 Tage**
336	**6.1.1.4 Baufeld 3**		**Mon 09.08.27**	**Fre 01.10.27**	**40 Tage**
344	**6.1.1.5 Baufeld 4**		**Die 18.04.28**	**Don 01.06.28**	**30 Tage**
356	**6.1.1.6 Baufeld 5**		**Mon 12.07.27**	**Die 07.03.28**	**165 Tage**
365	**6.1.2 Bauausführung Bauabschnitt 2**		**Mit 18.11.26**	**Die 05.09.28**	**445 Tage**
384	**6.1.2.2 Nördliche Umfahrung**		**Mon 20.09.27**	**Die 05.09.28**	**239 Tage**
406	**6.1.2.3 Gründung Kompostierungsanlage**		**Die 20.06.28**	**Mon 24.07.28**	**25 Tage**
411	**6.1.3 Fertigstellung Tiefbau 1**		**Die 05.09.28**	**Die 05.09.28**	**0 Tage**
412	**6.2 Ausschreibung 02: Umschluss Trafo**		**Mit 18.11.26**	**Fre 19.03.27**	**81 Tage**
413	**6.2.1 Notstrom für die Übergangszeit**		**Mit 18.11.26**	**Fre 19.03.27**	**81 Tage**
434	**6.3 Ausschreibung 03: Teilüberdachtes Lager**		**Mit 18.11.26**	**Fre 24.09.27**	**211 Tage**
435	6.3.1 Werkplanung	AN Teilüberdachtes Lager	Mit 18.11.26	Don 21.01.27	40 Tage
436	6.3.2 Geprüfte Statik	AN Teilüberdachtes Lager	Fre 22.01.27	Don 18.02.27	20 Tage
437	6.3.3 Übergabe Geprüfte Statik an AN Tiefbau 1	AN Teilüberdachtes Lager	Fre 19.02.27	**Mit 03.03.27**	9 Tage
438	6.3.4 Produktion, Lieferung	AN Teilüberdachtes Lager	Don 04.03.27	Die 29.06.27	79 Tage
439	6.3.5 Baustelleneinrichtung	AN Teilüberdachtes Lager	Die 29.06.27	**Fre 02.07.27**	3 Tage
440	6.3.6 Herstellung Wände	AN Teilüberdachtes Lager	Mon 05.07.27	Fre 30.07.27	20 Tage
441	6.3.7 Herstellen Dachtragkonstruktion einschl.. Dach und Fassade	AN Teilüberdachtes Lager	Mon 02.08.27	Fre 10.09.27	30 Tage
442	6.3.8 Restarbeiten	AN Teilüberdachtes Lager	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27	10 Tage
443	6.3.9 Fertigstellung	AN Teilüberdachtes Lager	Fre 24.09.27	Fre 24.09.27	0 Tage

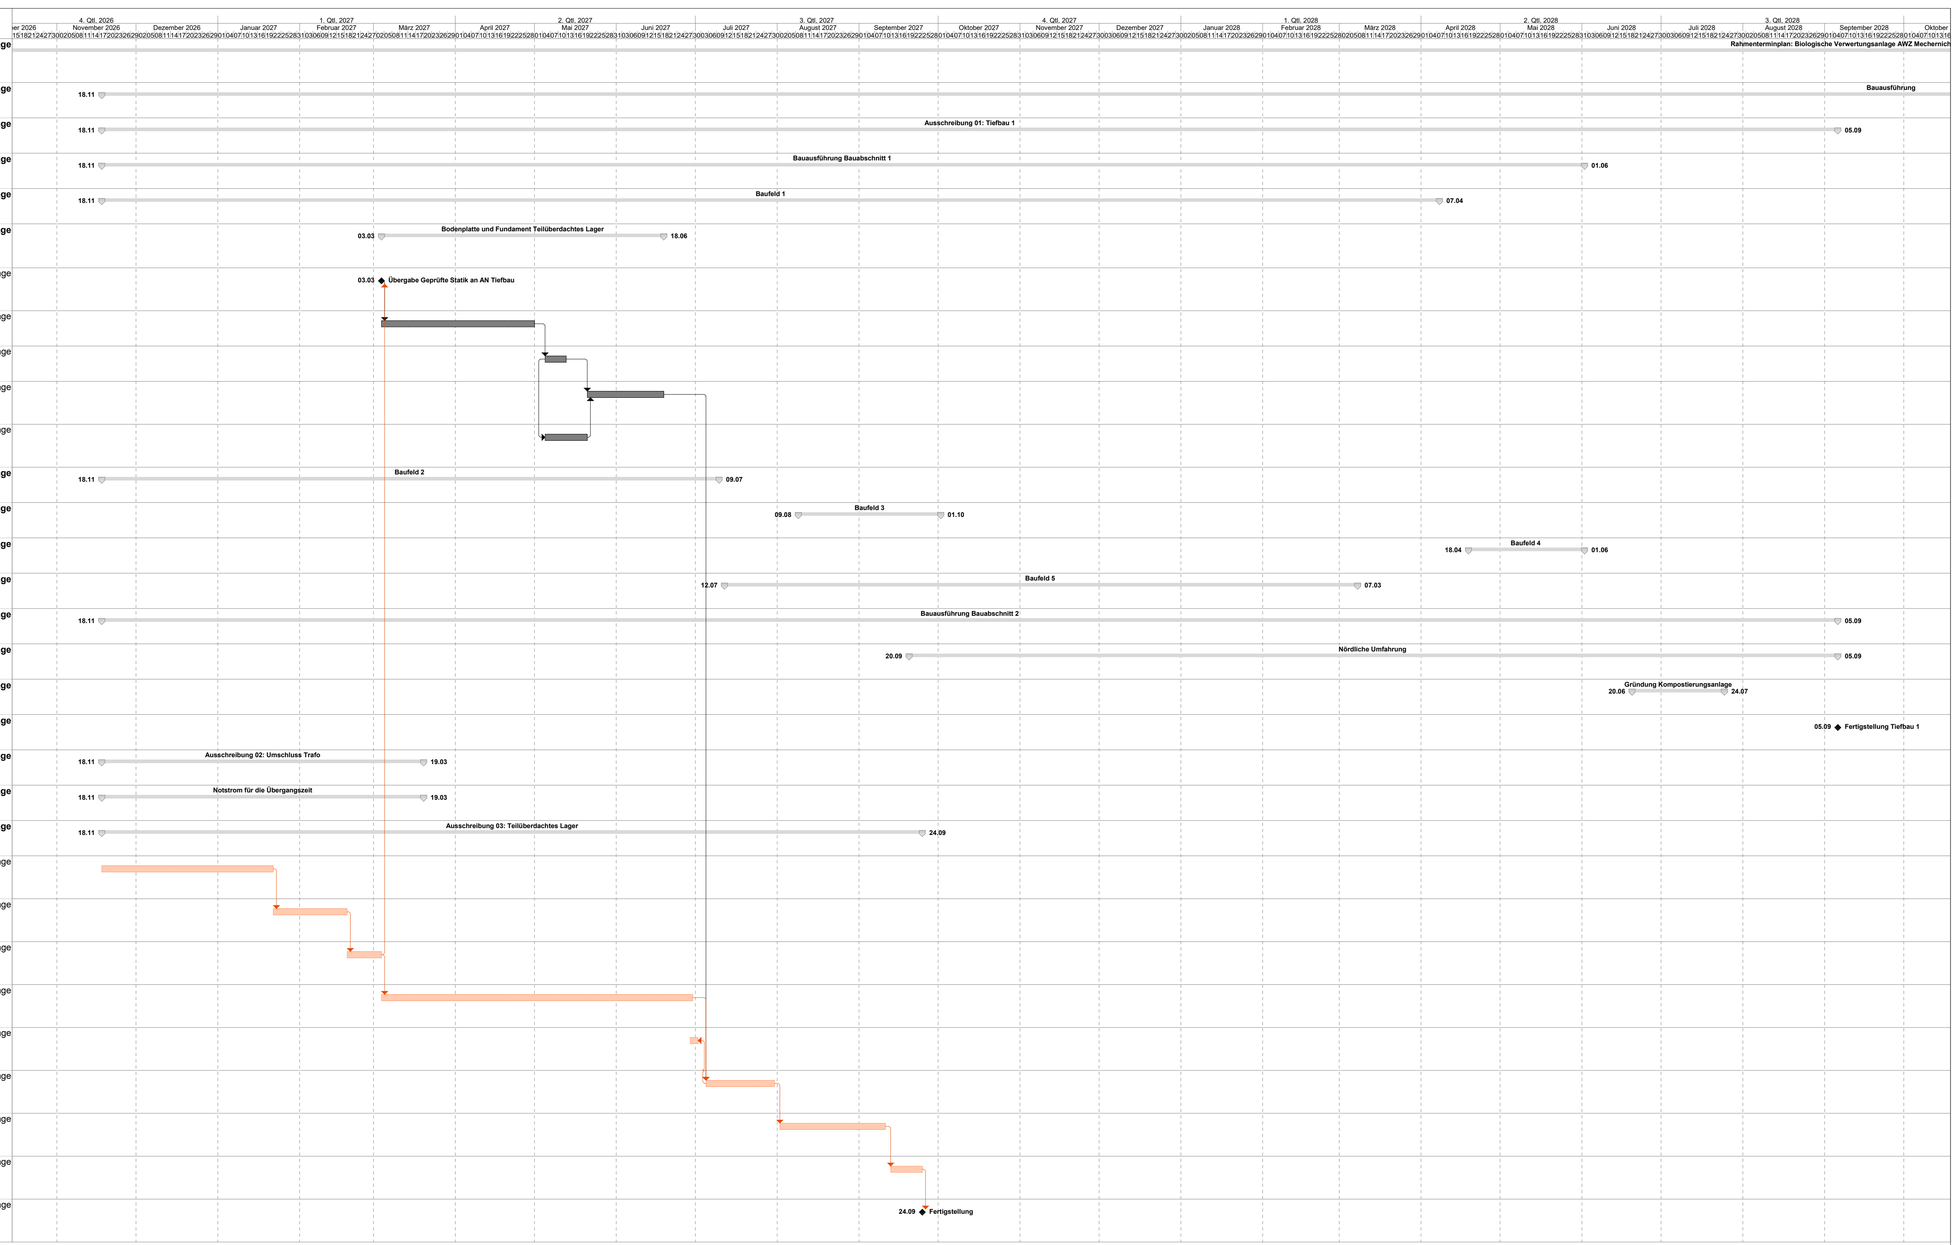

Projekt: Rahmenterminplan: Biologische Verwertungsanlage AWZ Mechernich
Datum: Fre 10.07.26

AG / Bauherr | pbo | Gutachter | Behörde | Meilenstein | Sammelvorgang | AN Tiefbau 1 | AN Trafo | AN Teilüberdachtes Lager

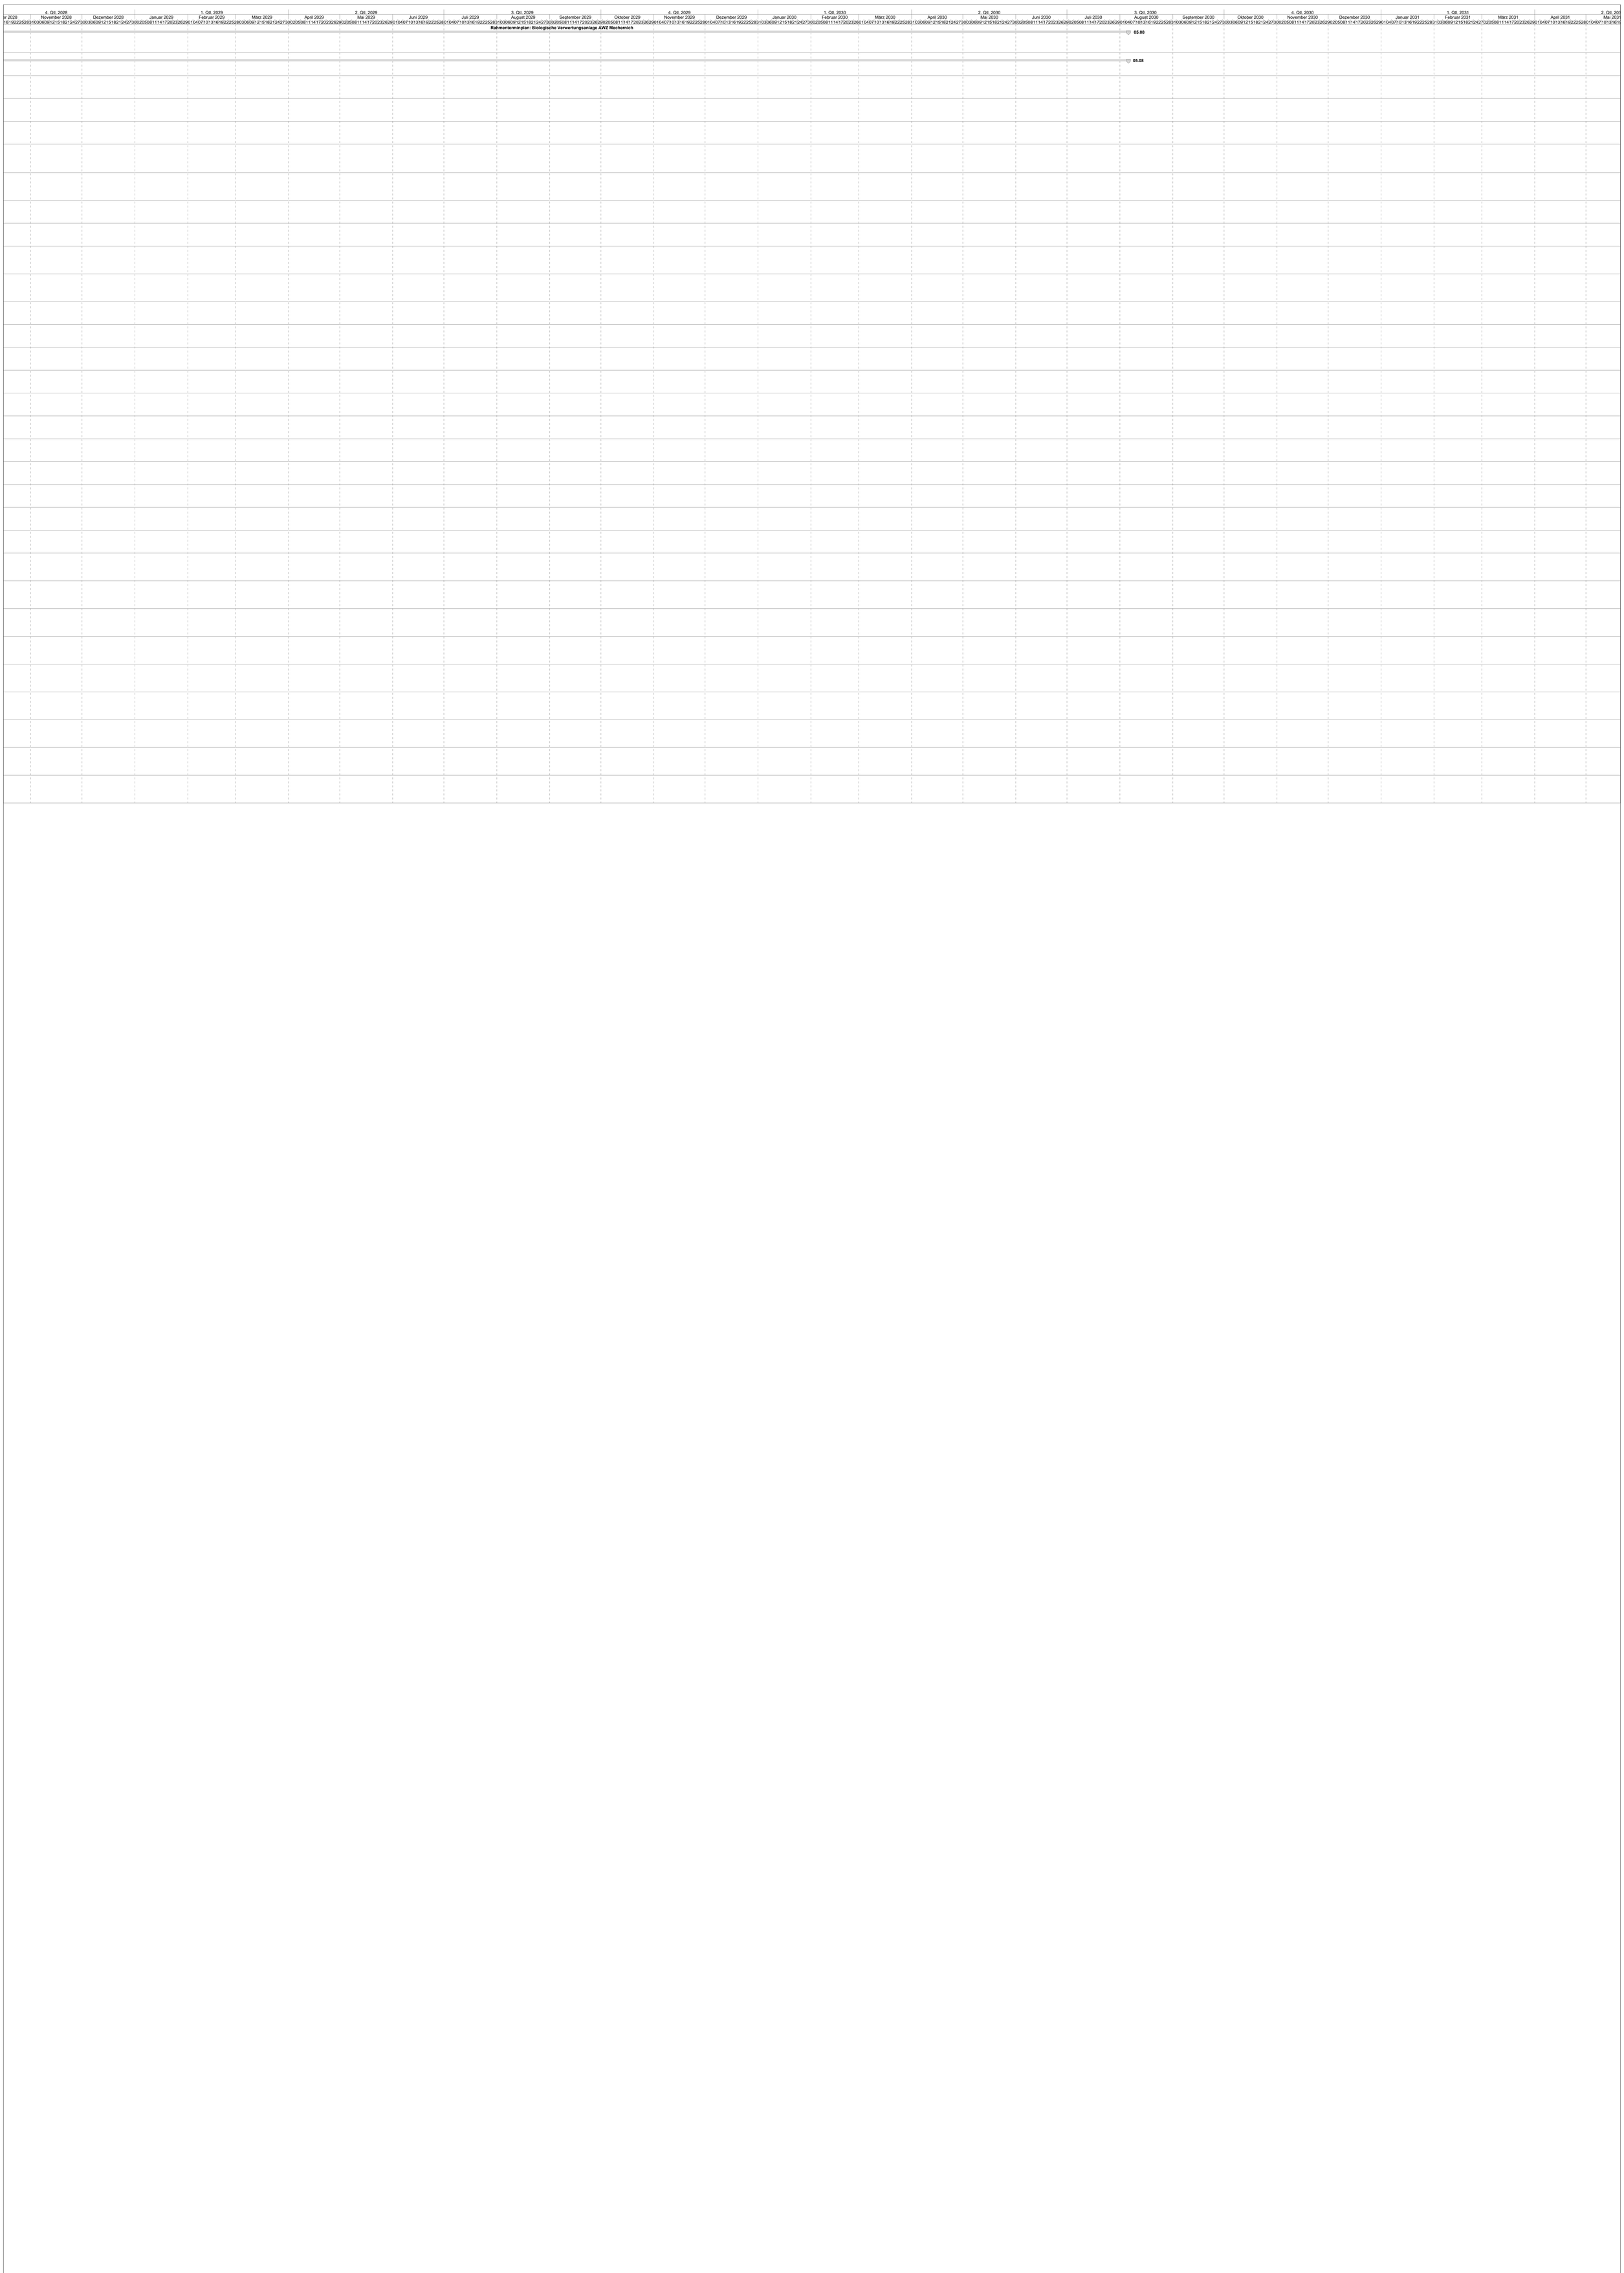

Projekt: Rahmenterminplan: Biologische Verwertungsanlage AWZ Mechernich
Datum: Fre 10.07.26

AG / Bauherr | pbo | Gutachter | Behörde | Meilenstein | Sammelvorgang | AN Tiefbau 1 | AN Trafo | AN Teilüberdachtes Lager
