Datei: FWB_260909_Bauzeitenplan.PPL

Projektnummer:

Bauzeitenplan

Neubau Feuerwehrgerätehaus Breinig

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	Rohbauarbeiten	82at	Mo, 18.01.27	Fr, 14.05.27	
1.1	Baustelleneinrichtung + Erdarbeiten	30at	Mo, 18.01.27	Fr, 26.02.27	
1.2	Entwässerung unter Sohle	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27	
1.3	Fundamente, Bodenplatte	13at	Mo, 15.03.27	Fr, 02.04.27	
1.4	Sockel	5at	Mo, 05.04.27	Fr, 09.04.27	
1.5	Einbau Sichtbetontreppe	9at	Mo, 03.05.27	Fr, 14.05.27	
2	Holzbauarbeiten	110at	Mo, 04.01.27	Fr, 11.06.27	
2.1	Werk + Montageplanung	68at	Mo, 04.01.27	Fr, 09.04.27	
2.2	Wände Erdgeschoss	10at	Mo, 12.04.27	Fr, 23.04.27	
2.3	Decke Erdgeschoss	5at	Mo, 26.04.27	Fr, 30.04.27	
2.4	Wände 1.Obergeschoss	13at	Mo, 03.05.27	Fr, 21.05.27	
2.5	Holzbinder Fahrzeughalle	5at	Fr, 14.05.27	Fr, 21.05.27	
2.6	Dach, Attika	14at	Mo, 24.05.27	Fr, 11.06.27	
3	Durchbrüche schließen	10at	Mo, 16.08.27	Fr, 27.08.27	
4	Industrieflächenheizung	5at	Mo, 15.03.27	Fr, 19.03.27	
5	Blitzschutzarbeiten	150at	Mo, 15.03.27	Fr, 15.10.27	
5.1	Blitzschutz Ringerder	5at	Mo, 15.03.27	Fr, 19.03.27	
5.2	Blitzschutz hochführen	5at	Mo, 14.06.27	Fr, 18.06.27	
5.3	Blitzschutz Fallrohre, PV	10at	Mo, 04.10.27	Fr, 15.10.27	
6	Dachdeckerarbeiten	104at	Mo, 24.05.27	Fr, 15.10.27	
6.1	Abdichtung Bodenplatte, Sockel	5at	Mo, 24.05.27	Mo, 31.05.27	
7	Notabdichtung	9at	Di, 01.06.27	Fr, 11.06.27	
6.2	Notabdichtung, Dämmung, Abdichtung, Gründach, Attika, Geländer, UK PV-Anlage	80at	Mo, 14.06.27	Fr, 01.10.27	
6.3	Attika, Fallrohre	10at	Mo, 04.10.27	Fr, 15.10.27	
8	Alu-/Fensterelemente	129at	Mo, 14.06.27	Fr, 10.12.27	
9	Werk + Montageplanung	59at	Di, 16.03.27	Fr, 11.06.27	
8.1	Montage Alu-Fenster	10at	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27	
8.2	Alu-Innentüren	5at	Mo, 06.12.27	Fr, 10.12.27	
10	Werk + Montageplanung	59at	Di, 16.03.27	Fr, 11.06.27	
11	Sektionaltore	10at	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27	
12	Gebäude dicht	1at	Mo, 28.06.27	Mo, 28.06.27	
13	Schlosserarbeiten	29at	Mo, 14.06.27	Do, 22.07.27	
14	Werk + Montageplanung	59at	Di, 16.03.27	Fr, 11.06.27	
13.1	Schwerter Vordächer/ Treppe vor Fassade	10at	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27	
13.2	Treppengeländer	10at	Mo, 28.06.27	Fr, 09.07.27	
13.3	Stahltreppe	9at	Mo, 12.07.27	Do, 22.07.27	
15	HLSE Installation	94at	Mo, 28.06.27	Fr, 05.11.27	
16	Werk + Montageplanung	68at	Mi, 17.03.27	Fr, 25.06.27	
15.1	Rohinstallation	70at	Mo, 28.06.27	Fr, 01.10.27	
15.2	Feininstallation	24at	Mo, 04.10.27	Fr, 05.11.27	
17	Trockenbauarbeiten	85at	Mo, 28.06.27	Fr, 22.10.27	
17.1	Trockenbau Wände 1-seitig	50at	Mo, 28.06.27	Fr, 03.09.27	
17.2	Einbau Stahlzargen	15at	Mo, 28.06.27	Fr, 16.07.27	
17.3	Trockenbau Abhangdecke	25at	Mo, 20.09.27	Fr, 22.10.27	
18	Estricharbeiten	47kt	Mo, 06.09.27	Fr, 22.10.27	
18.1	Estricharbeiten EG	10at	Mo, 06.09.27	Fr, 17.09.27	
18.2	Trocknungszeit	21kt	Sa, 18.09.27	Fr, 08.10.27	
18.3	Estricharbeiten 1.OG	10at	Mo, 20.09.27	Fr, 01.10.27	
18.4	Trocknungszeit	21kt	Sa, 02.10.27	Fr, 22.10.27	
19	Fliesenarbeiten	68kt	Mo, 04.10.27	Fr, 10.12.27	
19.1	Fliesenarbeiten, Start Wandfliesen	29at	Mo, 04.10.27	Fr, 12.11.27	
19.2	Rüttelfliesen	19at	Mo, 18.10.27	Fr, 12.11.27	
19.3	Trocknungszeit	28kt	Sa, 13.11.27	Fr, 10.12.27	
20	Malerarbeiten	34at	Di, 02.11.27	Fr, 17.12.27	
21	Bodenbeläge	10at	Mo, 22.11.27	Fr, 03.12.27	
22	Werk + Montageplanung	57at	Mo, 05.04.27	Fr, 25.06.27	
23	Holzfassade	80at	Mo, 28.06.27	Fr, 15.10.27	
24	Beleuchtung Fassade	10at	Mo, 04.10.27	Fr, 15.10.27	
25	Gerüstabbau	10at	Mo, 18.10.27	Fr, 29.10.27	
26	Abnahmen/ Mängelbeseitigung	15at	Mo, 10.01.28	Fr, 28.01.28	
27	Grundreinigung	15at	Mo, 17.01.28	Fr, 04.02.28	
28	Außenanlagen	61kt	Mo, 18.10.27	Fr, 17.12.27	
29	Ende Bauausführung	1at	Fr, 04.02.28	Fr, 04.02.28	
30	Einrichtung	15at	Mo, 07.02.28	Fr, 25.02.28	
31	Inbetriebnahme	15at	Mo, 21.02.28	Fr, 10.03.28	
32	Übergabe Nutzer	1at	Mo, 13.03.28	Mo, 13.03.28	
33	Bepflanzung	15at	Mo, 13.03.28	Fr, 31.03.28	

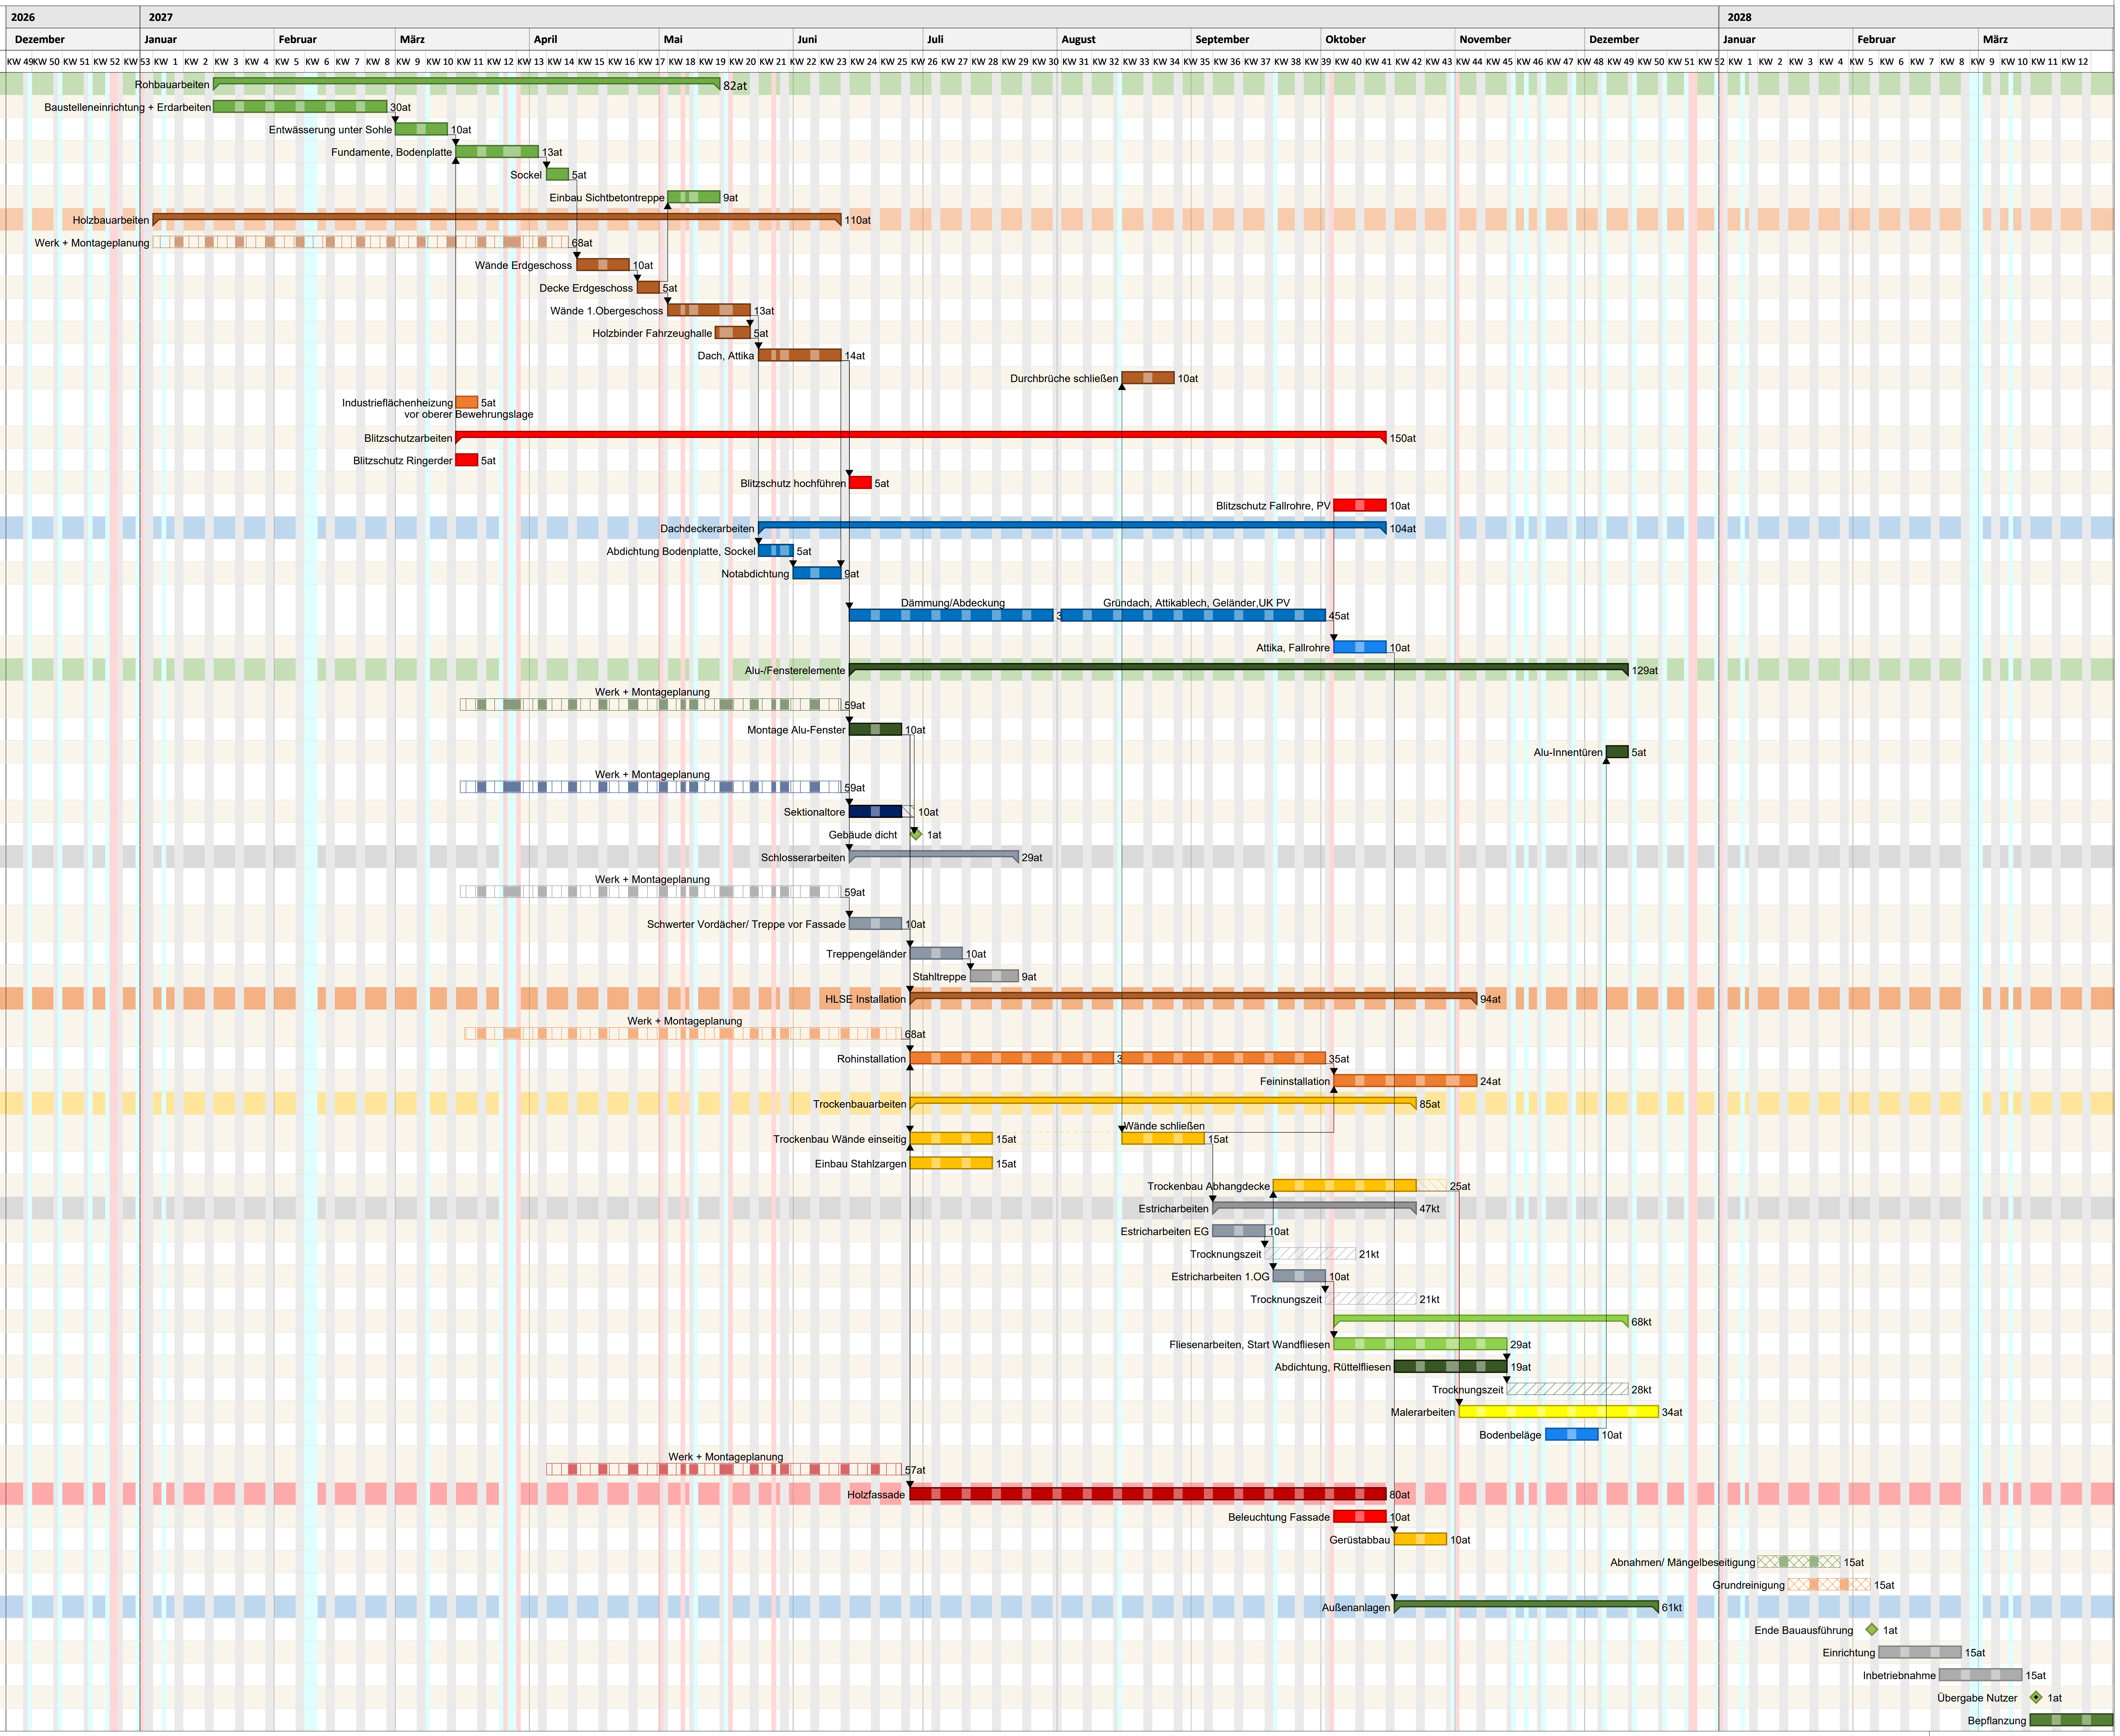

erstellt mit pro-Plan 2024 (24.0.0.6)   Serien Nr.: PPL24-DEFC03BE4684   Lizenz für Heitmann Architekten, Gütersloh
