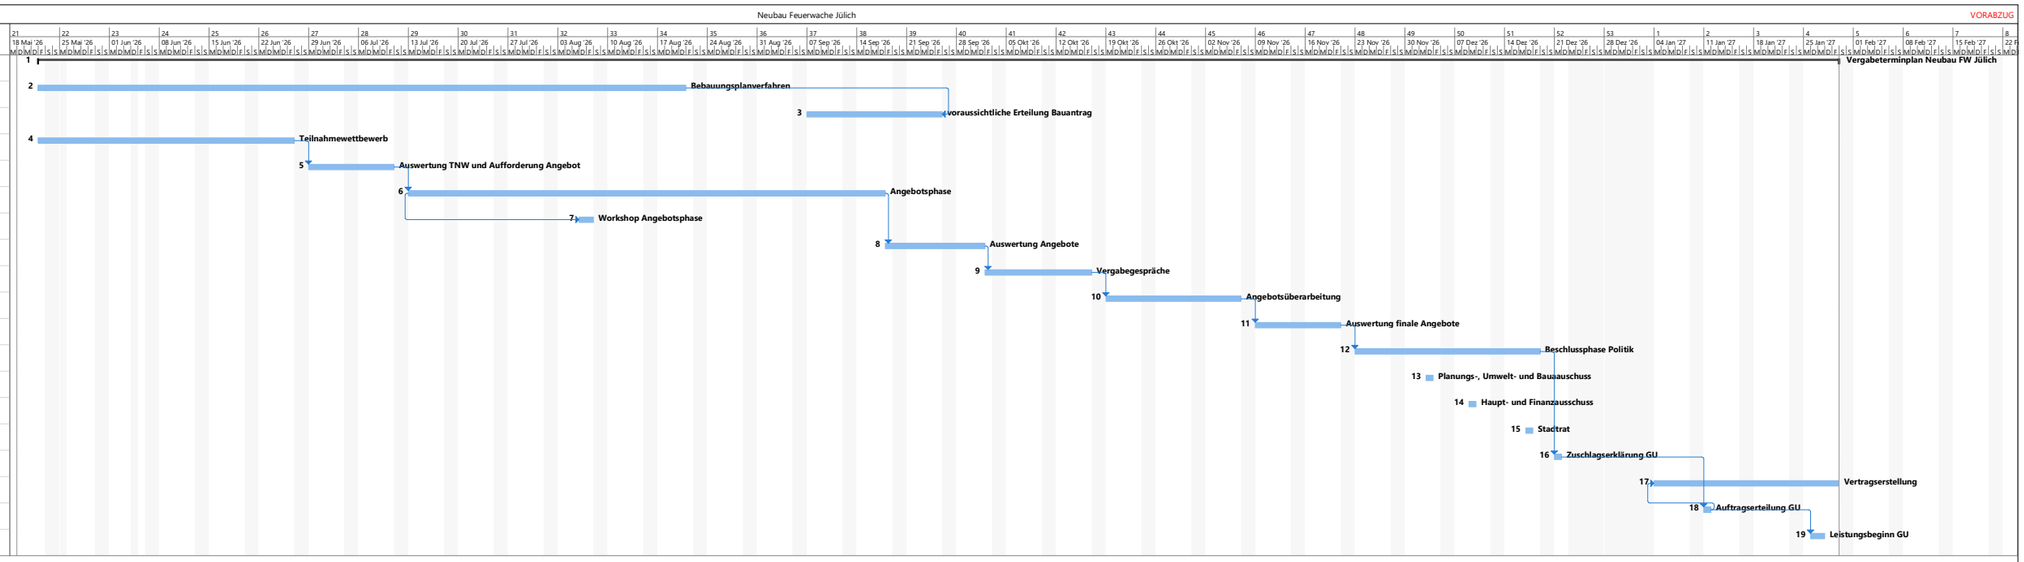Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Vergabeterminplan Neubau FW Jülich**	**Fre 22.05.26**	**Fre 29.01.27**
2	Bebauungsplanverfahren	Fre 22.05.26	Don 20.08.26
3	voraussichtliche Erteilung Bauantrag	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
4	Teilnahmewettbewerb	Fre 22.05.26	Fre 26.06.26
5	Auswertung TNW und Aufforderung Angebot	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
6	Angebotsphase	Mon 13.07.26	Don 17.09.26
7	Workshop Angebotsphase	Don 06.08.26	Fre 07.08.26
8	Auswertung Angebote	Fre 18.09.26	Don 01.10.26
9	Vergabegespräche	Fre 02.10.26	Fre 16.10.26
10	Angebotsüberarbeitung	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
11	Auswertung finale Angebote	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
12	Beschlussphase Politik	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
13	Planungs-, Umwelt- und Bauaauschuss	Don 03.12.26	Don 03.12.26
14	Haupt- und Finanzausschuss	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26
15	Stadtrat	Don 17.12.26	Don 17.12.26
16	Zuschlagserklärung GU	Mon 21.12.26	Mon 21.12.26
17	Vertragserstellung	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27
18	Auftragserteilung GU	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27
19	Leistungsbeginn GU	Die 26.01.27	Mit 27.01.27
