
TP.1979 | LOS Stahlbau PV Anlagen

Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Bestellung Los Stahlbau**	0 Tage	Mon 18.01.27	Mon 18.01.27
2		Zeitfenster Bauanlaufgespräch	15 Tage	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27
3		Erstellung/Abstimmung Terminplan	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
4		W+M-Planung + Abstimmung LOS EMSR	40 Tage	Mon 08.02.27	Die 06.04.27
5		Prüfung W+M-Planung	10 Tage	Mit 07.04.27	Die 20.04.27
6		revidierte W+M-Planung	10 Tage	Mit 21.04.27	Die 04.05.27
7		**Freigabe W+M-Planung**	0 Tage	Die 04.05.27	Die 04.05.27
8		Fertigung + Lieferung	50 Tage	Mit 05.05.27	Fre 16.07.27
9		Montage	50 Tage	Mon 19.07.27	Fre 24.09.27
10		Restarbeiten	10 Tage	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27
11		**VOB-Abnahme**	0 Tage	Fre 08.10.27	Fre 08.10.27
12					
13					
14					
15					
16					
17					

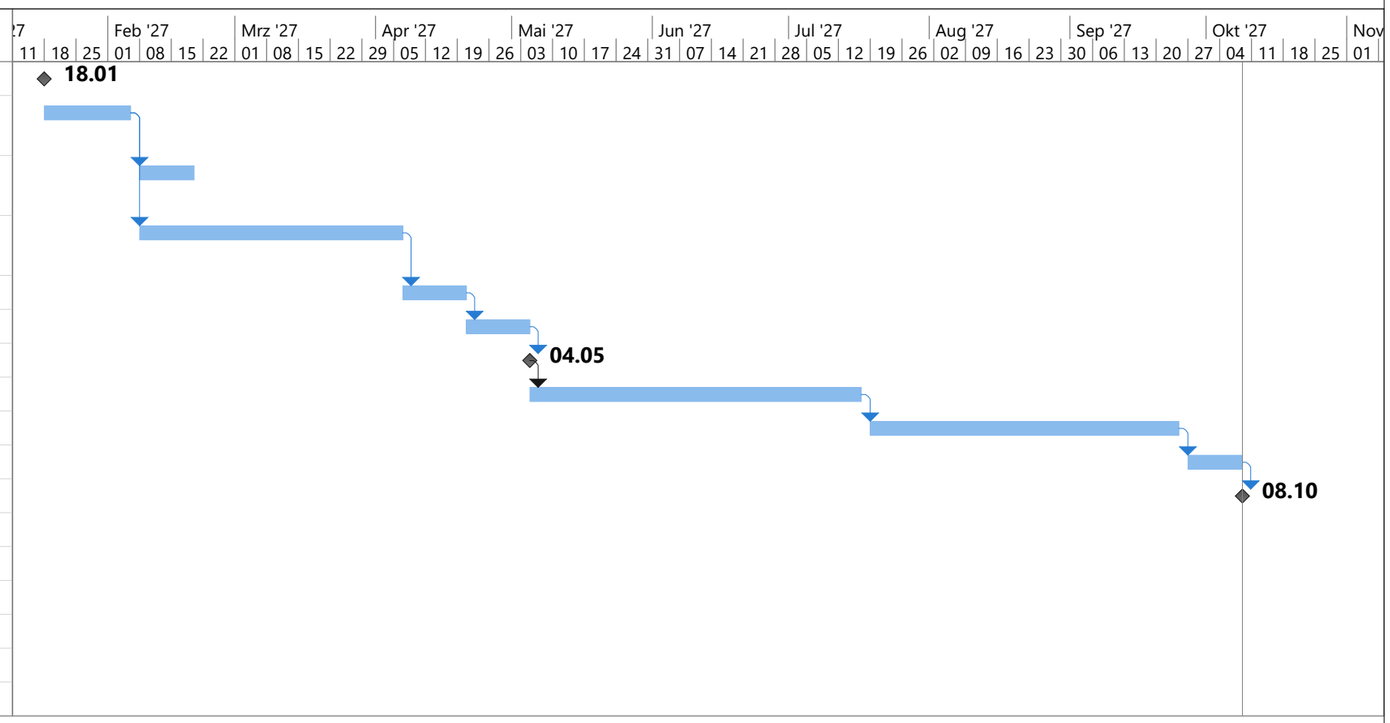

Projekt: Terminplan_VE13
Datum: Mon 09.11.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
